




Attività Estrattiva e Recupero Ambientale

CANTIERE: CASAGLIA
CAMPIONE: Sabbia Lavata
DATA : 18/03/2011
NOTE:

Mod.Finezza		1,903	
Luci Vagli (mm)	% passante	% trattenuto	trattenuto cumulativo
1,4	99,8	0,2	0,7
1,25	99,6	0,2	
1	99,3	0,3	
0,85	98,3	1	13,4
0,6	92,8	5,5	
0,5	86,6	6,2	
0,4	69,1	17,5	77,6
0,3	33,5	35,6	
0,25	22,4	11,1	
0,2	15	7,4	98,6
0,125	1,4	13,6	
0,063	0,5	0,9	
Fondello		0,5	
TOT.		100	

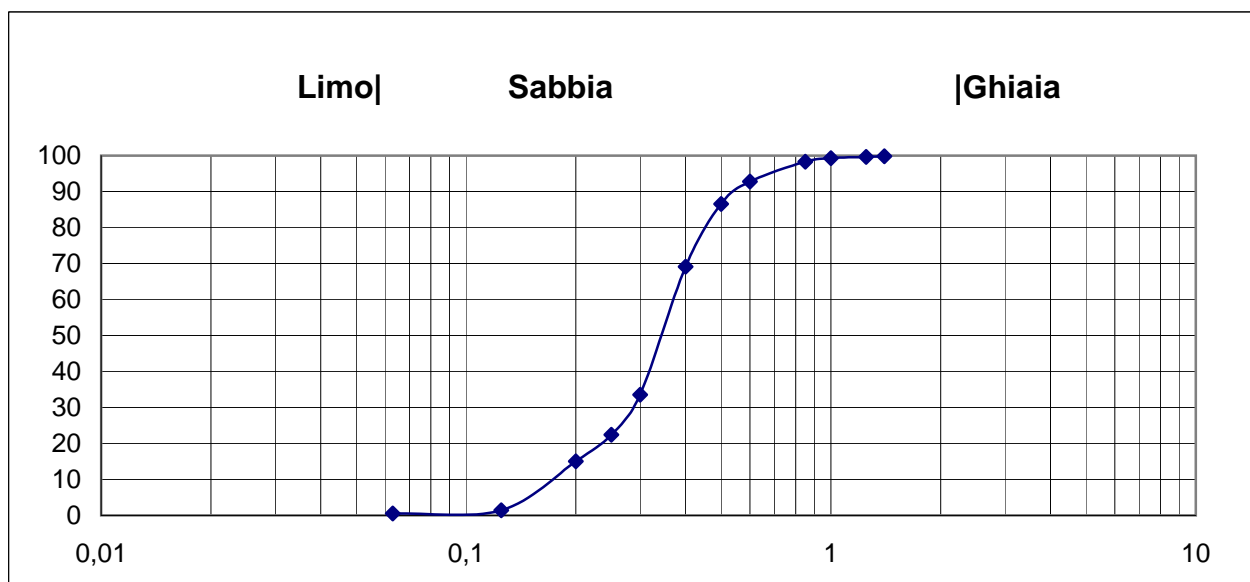

Codice interno: S1, S18, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S12, S13, S14, S15

Rev. 01 del 30/04/10

Prova eseguita con vibrosetacciatore. Durata: 29 minuti

Sperimentatore: Paolo Checchi

Il responsabile di laboratorio
 Dott. Geol. Nicola Orpelli
